

२०८० श्रावण

मुङ्केचुला गाउँपालिका/नगरपालिका
सबैको लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना,



आर्थिक वर्ष २०७९/८० को
वार्षिक
प्रगति प्रतिवेदन



मुङ्केचुला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
नर्कु, डोल्पा



सबैको लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा
स्वच्छता आयोजना,

बिषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रगतिको सारांश	2
1. आर्थिक प्रगति सारांश	2
2. भौतिक प्रगति सारांश	3
नतिजा १: आयोजना संचालित पालिकाहरुमा दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा र लैंगिक, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि सक्षम/सबल वातावरण र शासन सुदृढिकरण भएको हुनेछ।	3
नतिजा २: आयोजना संचालित पालिकाहरुमा जलवायु उत्थानशिल, सुरक्षित र नियमित खानेपानी आपूर्ति भएको हुनेछ।	4
नतिजा ३: दिगो सरसफाइ तथा स्वच्छता र मर्यादित महिनाबारी ब्यबस्थापन	4
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन	6
1. पृष्ठभूमि	6
2. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	7
3. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	12
4. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	14
5. नीति तर्जुमा	17
6. सहकार्य	17
7. आइपरेका मुख्य समस्याहरु	17
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	19
अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित खानेपानी योजनाहरुको विवरण	19
अनुसूची २.२: यस आ.व.मा संचालित संस्थागत शौचालय योजनाहरुको विवरण	20
अनुसूची २.३: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	21
अनुसूची ३.१: गत वर्ष २०७८।०७९ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था	23
अनुसूची ३.२: आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था	24
अनुसूची ४: गाउँपालिका/नगरपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	25
अनुसूची ५: भिजिविलिटी	26
अनुसूची ६: जनशक्ति विवरण	27



आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा
आयोजनाको नाम:	सबैको लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावण २०७९ देखि ३१ आषाढ २०८० (..... July to July.....)

1. आर्थिक प्रगति सारांश

आयोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	पूँजीगत:	३४७०४	३१३९२	२४४९२	७८
	कार्यक्रम / चालु:	९४८८	८८४६	८४५०	९५.५२
	जम्मा:	४४१९२	४०२३८	३२९४२	८१.८६
स्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	९०००	५३०९	५३०९	१००
	नेपाल सरकार	९६८४	९४२८	९४२८	१००
	दातृ निकाय (GoF / EU)	२५५०१	२५५०१	१८०९९	७०.९७
	अन्य				
	जम्मा (MWF):	४४१८५	४०२३८	३२८३६	
	उपभोक्ताको (Cash)	२३००	२३००	१८००	
	उपभोक्ताको (Kind)	११८९२	११८९२	८०२८	
	जम्मा (उपभोक्ता):	१४१९२	१४१९२	९८२८	
	कुल जम्मा:	५८३७७	५४४३०	४२६६४	



2. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: आयोजना संचालित पालिकाहरुमा दिगो खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सेवा र लैंगिक, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि सक्षम/सबल वातावरण र शासन सुदृढिकरण भएको हुनेछ।

क्षेत्र	आ.व. २०७९/८० को लक्ष	आ.व. २०७९/८० को उपलब्धि	मुस्वाको हालसम्मको उपलब्धि
खानेपानी तर्फ			
बाईगाड औल खानेपानि तथा सरसफाई योजना	निर्माण सम्पन्न गर्ने	निर्माण सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न
नर्कु खानेपानि तथा सरसफाई योजना	निर्माण सम्पन्न गर्ने	८०% काम सम्पन्न	
चन्दननाथ आवि खानेपानी तथा सरसफाई योजना	निर्माण सम्पन्न गर्ने	निर्माण सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न
इल खानेपानि तथा सरसफाई योजना	निर्माण सम्पन्न गर्ने	८०% काम सम्पन्न	
सर्भि खानेपानी तथा सरसफाई योजना	निर्माण सम्पन्न गर्ने	८०% काम सम्पन्न	
सस्थागत शौचालय निर्माण तर्फ			
मस्टा भवानी बालविकास केन्द्र शौचालय निर्माण योजना	निर्माण सम्पन्न गर्ने	निर्माण सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु:			
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु	५	५	५
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु	७	७	७



नतिजा २: आयोजना संचालित पालिकाहरुमा जलवायु उत्थानशिल, सुरक्षित र नियमित खानेपानी आपूर्ति भएको हुनेछ।

क्षेत्र	आ.व. २०७९/८० को लक्ष	आ.व. २०७९/८० को उपलब्धि	सुस्वाको हालसम्मको उपलब्धि
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	२	२	२ वटा योजना निर्माण सम्पन्न
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)	३	३	३ वटा योजना क्रमागता भै०८० सालमा निर्माण सम्पन्न हुने
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	४०८	४०८	४०८
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	२३९५	२३९५	२३९५
गोष्ठी तथा अभियानहरु:			
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु			
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	१	१	
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	१	१	

नतिजा ३: दिगो सरसफाइ तथा स्वच्छता र मर्यादित महिनाबारी व्यवस्थापन

क्षेत्र	आ.व. २०७९/८० को लक्ष	आ.व. २०७९/८० को उपलब्धि	सुस्वाको हालसम्मको उपलब्धि
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	१	१	
संस्थागत शौचालय (IPO)	०	०	
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरु:			
हातधुने स्थान (घर संख्या)			
चांग (घर संख्या)			
अन्य (घर संख्या)			
अन्य सूचकांकहरु:			
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी योजना घोषणा	०	०	०
खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	०	०	०



School WASH (3 – Star model)			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	०	०	०
२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	०	०	०
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या			

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांशः

- समावेशी नीति बिस्लेषण तथा योजना तर्जुमा कार्यशाला सम्पन्न
- प्याड निर्माण तालिम सम्पन्न
- उपभोक्ता समिति ब्यबस्थापन तथा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धि तालिम
- ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम
- वास युनिट का कर्मचारीहरुको क्षमता बिकास तालिम
- बिस्व चर्पी दिवस
- बिस्व पानि दिवस
- अन्तरास्ट्रिय महिला दिवस
- थप वास युनिटका कर्मचारीहरुको क्षमता बिकास तालिम
- पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि अभिमुखीकरण
- स्कूल वास सम्बन्धि अभिमिखिकरण
- पानि सुरक्षा योजना तालिम
- जलबायु अनुकुलन तथा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तालिम



आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा “सबैका लागि खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको समान अधिकारहरू प्राप्त गर्न स्थानीय सरकारहरूको सुधारिएको क्षमता मार्फत दिगो खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सेवाहरू र व्यवहारहरू सुनिश्चितत भई सुधारिएको कल्याणकारी र समावेशी समुदाय निर्माण गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि यस क्षेत्रका ५ जिल्लाहरू (कालिकोट, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (suswa) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७९ असार ०६ गतेमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, यस गाउँपालिका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा किटान गरिएका लक्ष्य वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९९ प्रतिशत रकम निकास भै रु. ८९.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु. ० रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु. ७४०२००० परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रु. ९०००००० मध्ये रु. ५३०९००० खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ५८.९८% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ६ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ३ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ३ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रुपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सारी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा मुडुकेचुला गाउँपालिकामा सबैका लागी दिगो खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका वास व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।



लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता गुरुयोजना” को कार्यान्वयन प्रगति

२.१.१. खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता गुरुयोजना को कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- बाईगाउँ औल खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण सम्पन्न
- चन्दननाथ आबी खापा योजना निर्माण सम्पन्न

२.१.२. योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- इल खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न
- सर्पि खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न
- नर्कु खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न
-

२.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- २ वटा खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न
- ३ वटा खानेपानी योजना को काम ८०% सम्पन्न
- १ बिद्यालय शौचालय योजना निर्माण सम्पन्न

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	५	२७८१	३	४०८	४०%	१४.६७



२	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	१	२२	१	२२	१००%	१००%
३							
४							



तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरू

क्र.सं.	क्षेत्र	योजनाको नाम	योजनाको संक्षिप्त विवरण
१	खानेपानी तर्फ	बाईगाउ औल खानेपानी तथा सरसफाई योजना	यो योजना मुड्केचुला गापा वार्ड न १ को ३८ घरधुरी लाई समेटेर निर्माण गरिएको हो यहाँ ३८ वटा निजि धारा र १ वटा बिद्यालय धारा निर्माण भयको छ । ९ वटा दलित घरधुरी र ३० वटा अन्य घरधुरीको बसोबास रहेछ छ जम्मा २२२ जनसंख्या लाभान्वित भयका छन् .
२	खानेपानी तर्फ	चन्दननाथ आवि खानेपानी योजना	यो योजना मुड्केचुला गापा वार्ड न ९ होरत मा रहेको श्री चन्दननाथ आवि खानेपानी निर्माण योजना हो । यहा कक्ष ८ सम्म पढाइ हुन्छ तर अहिले सम्म कुनै पनि खानेपानीको सुबिधा थियन . अहिले २ वटा स्कूल धारा बाट ८ वटा तुति बाट जम्मा १७० शिक्षक र बिध्यर्थिले पानि खाइरहेका छन् ।
३	सस्थागत शौचालय तर्फ	मास्टा भवानी बालबिकास केन्द्र शौचालय निर्माण योजना	यो योजना मुड्केचुला गापा वार्ड न ६ नर्कु मा रहेको श्री मास्टाभवानी बाल बिकास केन्द्र को शौचालय निर्माण योजना हो । यहा शिशु कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ तर अहिले सम्म कुनै पनि शौचालयको सुबिधा थियन . अहिले २ वटा प्यान सेट भयको शौचालयको बाट जम्मा २२ जना शिक्षक र बिध्यर्थिले सुविधा लिईरहेका छन् ।

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २.३: लक्ष्य बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका/नगरपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	परियोजनाको पैसा समयमा निकास नहुनु	परियोजनाले पैसा समयमै निकास कोलागी अनुरोध गर्ने
२	सप्लायर्स ले चैत्र महिनामा समान पठाउनु	समयमै सप्लायर्स लाई निर्माण सामग्री पठाउन निर्देशन दिने
३	बैशाख जेष्ठ र असार महिना मा स्थानीय कामदार किरा टिप्न हिमाल तिर जानु	स्थानीय क्यालेन्डर निर्माण गरि किरा टिप्ने सिजन अगावै योजनाको काम सम्पन्न गर्ने
४	दक्ष कामदार स्थानीय स्तर मा उपलब्ध नहुनु	दक्ष कामदार को लागि तालिम संचालन गर्ने
५	भौगोलिक बिकट भयको कारण	



२.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- समावेशी नीति बिस्लेषण तथा योजना तर्जुमा कार्यशाला सम्पन्न
- प्याड निर्माण तालिम सम्पन्न
- उपभोक्ता समिति ब्यबस्थापन तथा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धि तालिम
- ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम
- वास युनिट का कर्मचारीहरूको क्षमता बिकास तालिम
- बिस्व चर्पी दिवस
- बिस्व पानि दिवस
- अन्तरास्ट्रिय महिला दिवस
- थप वास युनिटका कर्मचारीहरूको क्षमता बिकास तालिम
- पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि अभिमुखीकरण
- स्कूल वास सम्बन्धि अभिमिखिकरण
- पानि सुरक्षा योजना तालिम
- जलवायु अनुकुलन तथा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तालिम

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम	२५	२१	०	०	५९	४५	८४	६६
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू	५	४	०	०	३९	१९	४४	२३
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरू	०	५	०	०	२	८	२	१३
खानेपानी , सरसफाई तथा स्वच्छता गुरुयोजना कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित तालिमहरू	४	४	०	०	७	१८	११	२२
जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू	६	८			१२	९	२०	१५
गाउँपालिका/नगरपालिका स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू	५३	२६			१७३	१६४	२२६	१९०



जम्मा:	९३	६८	०	०	२९२	२६३	३८७	३२९
प्रतिशत	२४।७६			८५।३८				

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

तालिका २.५: चरणबद्ध तालिममा सहभागीहरुको विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१					०	०	२८	२८	०	०	२८	२८
४					८	०	२०	२८	८	०	२०	२८
६					३१	०	१८	४९	३१	०	१८	४९
७					७		२१	२८	७	०	२१	२८
९					०	०	२८	२८	०	०	२८	२८
जम्मा					४६	०	११५	१६१	४६	०	११५	१६१

1.

अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
१.	बाईगाउ औल खानेपानि तथा सरसफाई योजना	३	२	५
२.	नर्कु खानेपानि तथा सरसफाई योजना	३	२	५
३.	चन्दननाथ आवि खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	२	५
४.	इल खानेपानि तथा सरसफाई योजना	३	२	५
५.	सर्मि खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	२	५
६.	मास्टा भवानी बालविकास शौचालय निर्माण योजना	३	२	५
७.				
	जम्मा	१८	१२	३०

तालिका ३.२: गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट आयोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	९	९	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन			
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१०	१०	०

तालिका ३.३: अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०८०/०३/१४ देखि १७ गते सम्म	चन्दननाथ आबी खापा योजना १. चन्दननाथ आवि खापा. योजना को सम्पन्न हुँ नसकेको सानो सानो काम अन्तिम भुक्तानी लिनु भन्दा अगाडी गरिसक्नु पर्ने २. योजनाको रंग रोगन गर्नु पर्ने ३. RVT को घेरबार गर्नु पर्ने	१. सम्पन्न योजनाको सबै काम सम्पन्न गरेको २. सम्पन्न योजनाको रंग रोगन गरेको
२	२०८०/०३/१५ गते	शर्मि खापा तथा सरसफाई योजना १. धारा निर्माण गर्नु पर्ने	१. अनुगमन टोली ले दिएको सम्पूर्ण सुझावहरु कार्यान्वयन गरेको



		- मुहानमा ग्याबिन जाली ६० भरि पुर्याउनु पर्ने - RVT को घेरबार र अन्य अपुरो कामहरु सम्पन्न गर्नु पर्ने - सार्वजनिक तथा संस्थागत धारा निर्माण गर्नु पर्ने - योजनाको ८०% काम पुरागरेपछी मात्र भुक्तानी दिने	
३	२०८०/०३/१६ गते	इल खापा तथा सरसफाई योजना - धारा निर्माण गर्नु पर्ने - RVT को घेरबार र अन्य अपुरो कामहरु सम्पन्न गर्नु पर्ने - सार्वजनिक तथा संस्थागत धारा निर्माण गर्नु पर्ने - योजनाको ८०% काम पुरागरेपछी मात्र भुक्तानी दिने	अनुगमन टोलि ले दियको सम्पूर्ण सुझावहरु कार्यान्वयन गरेको
४	२०८०/०३/१७ गते	बाईगाउँ औल खापा तथा सरसफाई योजना - योजनाको सम्पूर्ण सरचनामा रंगरोगन गर्नु पर्ने - बाकि रहेको भल्व च्यामबर निर्माण गर्नु पर्ने	अनुगमन टोलि ले दियको सम्पूर्ण सुझावहरु कार्यान्वयन गरेको
५	२०८०/०३/१८ गते	नर्कु खापा तथा सरसफाई योजना - धारा निर्माण गर्नु पर्ने - मुहानमा ग्याबिन जाली ६० भरि पुर्याउनु पर्ने - RVT को घेरबार र अन्य अपुरो कामहरु सम्पन्न गर्नु पर्ने - सार्वजनिक तथा संस्थागत धारा निर्माण गर्नु पर्ने - योजनाको ८०% काम पुरागरेपछी मात्र भुक्तानी दिने	अनुगमन टोलि ले दियको सम्पूर्ण सुझावहरु कार्यान्वयन गरेको
६	२०८०/०३/१८ गते	मास्टा भवानी बाल बिकास केन्द्र शौचालय निर्माण योजना - काठको र्याम निर्माण गर्नुपर्ने - रंगरोगन गर्नु पर्ने	अनुगमन टोलि ले दियको सम्पूर्ण सुझावहरु कार्यान्वयन गरेको



प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

तालिका ४.१: गाउँपालिका/नगरपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७९/०५/१३	- खानेपानी सरसफाई स्वच्छता ईकाई स्थापना संबन्धमा - वास युनिट कर्मचारी भर्ना कालागि सुचना परकाशन गर्ने - कर्मचारी छनोट समित गठन संबन्धमा
२	२०७९/०६/०८	- कर्मचारी छनोट नतिजा तथा प्रकाशन संबन्धमा - वास ईकाईका कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति दिने संबन्धमा - फोकल व्यक्ति र सूचना अधिकारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने संबन्धमा
३	२०७९/०७/१८	- आ.व. ०७९/०८० मा निर्माण गरिने योजनाहरुमा चरण बद्ध कार्यपद्धती अन्तरगतका गोष्ठी संचालन गर्ने - वास ईकाई कर्मचारहरुको कार्यालय ब्यबस्थापन गर्ने - उपभोक्ता समिति ब्यबस्थापन तालिम संचालन गर्ने - वास ईकाई कार्यालय ब्यबस्थापन को लागि कुर्ची, टेबुल दराज र ल्यापटप खरिद गर्ने
४	२०७९/०८/१८	- वास ईकाईका कर्मचारीको क्षमता बिकास तालिम संचालन गर्ने - वास प्राबिधिक र सामाजिक परिचालक पदको बिज्ञापन गर्ने
५	२०७९/०८/२९	आ.व. ०७९/०८० को बार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट को समिक्षा तथा संसोधन गर्ने
६	२०७९/०९/२१	आगामी आ.व. ०८०/०८१ का लागि योजना छनोट गर्ने
७	२०७९/१०/१५	WASHMC पधाधिकारीहरु को सिकाइ आदान प्रदान अबलोकन भ्रमण गर्ने
८	२०७९/११/२१	११३ औ अन्तरास्ट्रिय महिला दिवस मनाउने संबन्धमा - ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम संचालन गर्ने - बिस्व पानि दिवस मनाउने - योजनालाई पहिलो किस्ता रकम पेस्की उपलब्ध गराउने - प्याड निर्माण तालिम संचालन गर्ने - फोहर ब्यबस्थापन का लागि डसबिन तथा सरसफाई सामग्री खरिद गर्ने
९	२०७९/१२/२३	आगामी आ.व. ०८०/०८१ का लागि बार्षिक कार्य योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्ने



१०	२०८०/०२/१३	- सम्पन्न योजनाको अन्तिम अनुगमन गर्ने - पानि सुरक्षा योजना तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि तयारि तालिम संचालन गर्ने - जलबायु अनुकुलन तथा प्रोकोप जोखिम न्यूनीकरण तालिम संचालन गर्ने - स्कूल वास तालिम संचालन गर्ने
११	२०८०/०३/०८	- आ.व. ०८०/०८१ को बार्षिक कार्य योजना तथा बजेट गाउसभामा पेस गर्ने - सम्पन्न योजनाको भुक्तानी गर्ने - आ.व. ०७९/०८० मा सम्पन्न नहुने योजनाहरुको आ.व. ०८०/०८१ का लागि म्याद थप गर्न गाउकार्य पालिकालाई अनुरोध गर्ने
१२	२०८०/०३/२७	- वास युनिट का कर्मचारीहरुको बार्षिक कार्य सम्पादन गर्ने - आ.व. ०८०/०८१ का लागि वास युनिट का सबै कर्मचारीहरुको नियुक्ति म्याद थप गर्ने
वास युनिटको मासिक बैठक		
१	२०७९/०८/२८	- हाल सम्मको प्रगति समिक्षा संबन्धमा - संचालित योजनाको घरधुरी तथा जनसंख्या विवरण लिने - वास युनिट कर्मचारीको क्षमता बिकास तालिम मा सहभागी हुने
२	२०७९/०९/२१	- संचालित योजनाको घरधुरी तथा जनसंख्या विवरण लिने - आ ब ०८०/०८१ मा निर्माण गर्ने योजनाको पुर्ब सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने - संचालित योजनाको पी ए भाइल टेस्ट गर्ने - उपभोक्ता समितिको कोटेशन खोल्ने संबन्धमा
३	२०७९/११/१२	- हाल सम्मको प्रगति समिक्षा संबन्धमा - कोबो मा डाटा लिने संबन्धमा - ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम संचालन संबन्धमा - बिस्व पानि दिवस मनाउने संबन्धमा - योजनालाई पहिलो किस्ता पेसकी रकम उपलब्ध गराउने
४	२०७९/१२/२२ गते	- योजनाको काम संचालन संबन्धमा - जुम्ला रोडको सामान गुणस्तर चेकजाच गर्न जाने संबन्धमा



**SUOMI
FINLAND**

		● School WASHMC गठन तथा अभिमुखीकरण गर्ने संबन्धमा ● प्याड निर्मन तालिम संचालन संबन्धमा
५	२०८०/०१/२९ गते	● परियोजनाको हाल सम्मको प्रगति समिक्षा संबन्धमा ● पूर्ण सरसफाई अभिमुखीकरण गोष्ठी संचालन संबन्धमा ● सरसफाई सप्ताह मनाउने संबन्धमा
६	२०८०/०२/२९ गते	● प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा ● योजनाको सुचना बोर्ड बनाउने संबन्धमा ● योजनाको अन्तिम अनुगमन गर्ने संबन्धमा
७	२०८०/०३/२७ गते	● परियोजनाको हाल सम्मको प्रगती समिक्षा संबन्धमा ● बार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने संबन्धमा ●



नीति तर्जुमा

१. जलस्रोत नियमावली २०७९ कार्यपालिकाबाट पास भयो
२. खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) निर्देशिका २०७९ पास
- ३.

सहकार्य

तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	मुड्केचुला गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा डोल्पा	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस	Suswa आयोजना र महिला तथा बालबालिका शाखा डोल्पा नगद सहकार्य	SUSWA आयोजनाको नगद २०००० महिला तथा बालबालिका शाखाको २०००००० जम्मा २२००००० मा महिला दिवस सम्पन्न
२				

आइपरेका मुख्य समस्याहरू

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू हालको अवस्था कुनै विवाद भए सो र समाधानको अवस्था
१.	फिनल्याण्ड सरकारबाट आउने बजेट समयमै सुत्र मा इन्ट्री नहुनु	○
२.	फिनल्याण्ड सरकारबाट आउने बजेट समयमै निकास नहुनु	○ योजनाको समयमै बाह्य निर्माण सामग्री खरिदको लागि सप्लायर्स छनोट भयपनी परियोजनाको पैसा निकास नहुदा योजना मा समान चैत्र मसान्तमा आइपुग्यो र निर्माण गर्न ढिलाई भयो जसका कारण ३ वटा योजना अर्को बर्स निर्माण गर्नु पर्ने अबस्था सिर्जना भयो .



		○ चालु तर्फ का सबै क्रियाकलाप बजेट निकास नभएको कारण समयमै सबै क्रियाकलाप सम्पन्न हुन नसक्नु
३.	काम गर्ने सिजन मा स्थानीय काम दार सबै हिमाल तिर किरा टिप्न जानु	○



अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाई योजना								
बाईगाउ औल खानेपानि तथा सरसफाई योजना	१	४००१७९०	३६०५१६९	३६०५१६९	१५०००००	नजाने	०	२२२
नर्कु खानेपानि तथा सरसफाई योजना	६	६८७१९५०	५६६८०३०	५६६८०३०	०	जाने	१२०३९२०	५८४
चन्दननाथ आवि खानेपानी तथा सरसफाई योजना	९	१०९३६९६	९९४०००	९९४०००	०	नजाने		१६४
इल खानेपानि तथा सरसफाई योजना	४	८६१०५६९	६८१०५९२	६८१०५९२	०	जाने	१७९९९७७	६७४
सर्मि खानेपानी तथा सरसफाई योजना	७	८४८६२९४	६७६४५१८	६७६४५१८	०	जाने	१७२१७७६	११३७
जम्मा:		२९०६४२९९	२३८४२३०९	२३८४२३०९	१५०००००		४७२५६७३	२७८१
संस्थागत शौचालय								
मास्टा भवानी बालविकास शौचालय निर्माण योजना	६	९७६४९६	९३१०००	९३१०००	११९०००	नजाने	०	२२
जम्मा:		९७६४९६	९३१०००	९३१०००	११९०००		०	२२

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित खानेपानी योजनाहरूको विवरण

क्र. सं.	सञ्चालित खानेपानी योजनाहरुको बिबरण				क. खानेपानी सेवाको स्तरता	ख.लाभान्वित जनसंख्या				ग.अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु			घ.जातियता वर्गीकरण					
	क. खानेपानी योजनाहरुको नाम	वडा नं	बस्तीको नाम	घरधुरी संख्या	न्यून स्तरिय, आधारभूत, मध्यम र उच्च	महिला	पुरुष	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	अन्य	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
१.	नर्कु खानेपानी तथा सरसफाई योजना	६	नर्कु	१०६	उच्च	३१०	२७४		५८४	५	७		७३	८३				
२.	सर्मि खानेपानी तथा सरसफाई योजना	७	सर्मि	२०१	उच्च	५५३	५७४		११३७									
३	इल खापा तथा सरसफाई योजना	४	इल	१३५	उच्च	३३०	३४४		६७४									
४	बाईगाउँ औल खापा तथा सरसफाई योजना	१	औल	३९	उच्च	११२	११०		२२२									
५	चन्दननाथ आबी खापा योजना	९	होर्ते		उच्च				१६४									

अनुसूची २.२: यस आ.व.मा संचालित संस्थागत शौचालय योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित संस्थागत शौचालय योजनाहरुको बिबरण	क. शौचालय को किसिम	ख. बाल, लैङ्गिक अपाङ्गता, (CGD) मैत्री	ग.लाभान्वित जनसंख्या	क. विद्यालय खासस्व (तिन तारा मोडेल) School WASH (3 – Star model)

क्र.सं.	क. संस्थागत शौचालय योजनाहरुको नाम	वडा नं	बस्तीको नाम	घरधुरी संख्या	विद्यालय/ स्वास्थ्य चौकी / सार्वजनिक स्थल	छ	छैन	छात्र	छात्रा	शिक्षक		अन्य	० – तारा पुगेको विद्यालय संख्या O-Star	१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या 1-Star	२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या 2-Starr	३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या 3-Star
										महिला	पुरुष					
१	मास्टा भवानी बाल बिकास केन्द्र शौचालय निर्माण योजना	६	नर्कु	२२	बिद्यालय	छ		११	१०	१			०	०	०	०

अनुसूची २.३: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	परियोजना अभिमुखीकरण गोष्ठी	१,४,६,७,९	१ दिन	६	६	५			१४	१२
२	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेसीकरण गोष्ठी	१,४,६,७,९	१ दिन	६	६	५			१४	१२



३	मर्मत सम्भार अभिमुखीकरण	१,४,६,७,९	१ दिन	६	६	५			१४	१२
४	आर्थिक ब्यबस्थापन गोष्ठी	१,४,६,७,९	१ दिन	६	७	६			१५	१३
सरसफाइ, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु										
१	प्याड निर्माण तालिम	गाउँपालिका	३	१	१	०			२४	२
२	बिस्व चर्पी दिवस	गाउँपालिका	१	१	४	५			२७	२५
३	बिस्व पानि दिवस	गाउँपालिका	१	१	३	२			८	२०
४	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस	गाउँपालिका	१	१	२३	७			६७	४८
४	पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि अभिमुखीकरण गोष्ठी	गाउँपालिका	१	१	३	०			३	२७
५	स्कुल वास अभिमुखीकरण	१,४,६,७,९	१	५	१७	११			३३	४३
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम	गाउँपालिका	११	१	०	४			२	११
गाउँपालिका/नगरपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	समाबेसी नीति बिस्लेषण तथा योज तर्जुमा कार्यशाला	गाउँपालिका	३	१	४	४			१५	१७
२	उपभोक्ता समिति ब्यबस्थापन तथा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धि तालिम	गाउँपालिका	३	१	४	४			७	१५
३	वास युनिट का कर्मचारीहरुको क्षमता बिकास तालिम	गाउँपालिका	५/३	२	२	०			१	१५
४	पानि सुरक्षा योजना तालिम	गाउँपालिका	३	१	६	८			१२	१८



अनुसूची ३.१: गत वर्ष २०७९।०८० सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छयौट पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छयौट पेशकी / वेरुजु रकम रु
०	०	०	०



अनुसूची ३.२: आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थप भएको समेत कुल पेशकी / बेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७८/०७९ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७९/०८० मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत ०७९।०८० सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत
०	०	०	




अनुसूची ४: गाउँपालिका/नगरपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

मुङ्केचुला गाउँपालिका वडा नं. १ डोल्पा मा बसोबास गरिरहेकी हास कुमारी रोकाया को घर बाईगाउँ औल को माथि डाडा मा रहेको छ । उहाको ७ जनाको परिवार रहेको छ । उनको घर नजिक पानि को स्रोत नै छैन । उनलाई खानेपानी ल्याउन ३० मिनेट पर जानुपर्थ्यो । उहालाई खानेपानी को धेरै समस्या थियो फोटो मा देखाय जस्तै उहालाई पानि ल्याउन आउदा जादा १ घण्टा समय लाग्थ्यो ।

अहिले उक्त गाउमा आ.व. ०७९/०८० मा मुङ्केचुला गाउपालिका र सबैको लागि दिगो खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (suswa) आयोजना को आर्थिक सहयोग मा बाईगाउ औल खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण भयपछि उहाको घरमै पानि पुगेको । गाउपालिका र suswa आयोजनाको जम्मा रु ३६०५१६९ लगानी र उपभोक्ता को १०३३३११ रुपैयाको गरि जम्मा रु ४६३८४८० मा उक्त बाईगाउ औल खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण सम्पन्न भयको छ । यस योजनामा ३८ वटा निजि धारा र १ वटा बिद्यालय धारा निर्मन भयका छन् ।

अहिले हास कुमारी रोकाया घरमै निजि धारा पुगेपछि निकै खुसि भयकी छन् । १ घण्टा हिड्नु पर्ने बाध्यता हटेको छ भने २४ घण्टा आफ्नो घरमा सफा स्वच्छ खानेपानी खाइरहेकी छन् । उहा भन्नु हुन्छ यो पानि ल्याउने मुङ्केचुला गाउपालिका र सबैका लागि दिगो खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता suswa आयोजना लाइ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

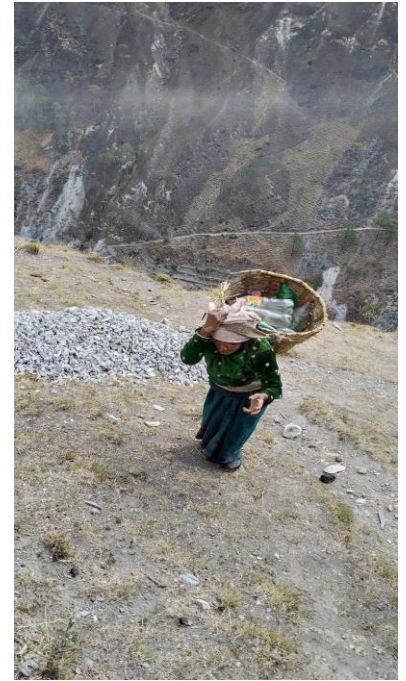

अनुसूची ५: भिजिविलिटी

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	रेडियो	२०७९/०८/०३	बिस्व चर्पी दिवस को प्रत्यक्ष प्रसारण
२	रेडियो	२०७९/११/२४	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस को प्रत्यक्ष प्रसारण
३	टिसर्ट	२०८०/०३/२२	परियोजनाको लोगो सहित को टिसर्ट



अनुसूची ६: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
क.	गाउँपालिका/नगरपालिका वास ईकाइ अन्तर्गत रहने गरि:			
१	देवराज रावत	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	वास फोकल पर्सन	१२ महिना part time
२	संजय शाह	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	सूचना प्रविधि अधिकृत	१२ महिना part time
३	सुनिल बिश्वकर्मा	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	वास संयोजक	१२ महिना
४	मदन बोहोरा	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	प्राविधिक सहजकर्ता	१२ महिना
५	मिराजन शाही	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	वास सहजकर्ता	१२ महिना
६	नवराज बोहोरा	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	वास प्राविधिक	१२ महिना
७	ठमिन शाही	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	वास प्राविधिक	१२ महिना
८	महेश शाही	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	वास प्राविधिक	१२ महिना
९	बलजित रोकाया	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	सामाजिक परिचालक	१२ महिना
१०	गोरख बुढामगर	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	सामाजिक परिचालक	१२ महिना
११	बृहस्पति शाही	मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा	सामाजिक परिचालक	१२ महिना





समावेशी नीति बिस्लेषण तथा योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी मा समुह प्रस्तुति गर्दै मालिका मावि का हेडसर ज्ञानेन्द्र शाही





सेनीटर प्याड निर्माण तालिम





अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस २०७९



चन्दननाथ आवि खापा योजनाको को दोस्रो अनुगमन





ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम २०७९



